



## **NOTFALLPLANUNG ASSE**

BGE BUNDESGESELLSCHAFT FÜR ENDLAGERUNG

**BETRIFFT ASSE** 

1 ÜBERBLICK ÜBER DIE NOTFALLPLANUNG

2 SACHSTÄNDE DER NOTFALLPLANUNG

3 SCHWERPUNKT: STRÖMUNGSBARRIEREN

4 FRAGERUNDE

20. Oktober 2022





## HINTERGRÜNDE

Von 1909 bis 1964 werden rund 5 Millionen Kubikmeter Salz abgebaut

Seit 1988 treten in der Südflanke des Bergwerkes Salzlösungen aus dem Deckgebirge in das Bergwerk Seit dem Jahr 2013 besteht der Auftrag zur Rückholung





Von 1967 bis 1978 werden rund 126.000 Fässer mit Atommüll eingelagert

Die Notfallplanung ist das Ergebnis einer im Jahr 2009 vorgenommenen radiologischen und bergbaulichen Sicherheitsüberprüfung



## **BLICKWINKEL AUF DAS BERGWERK**

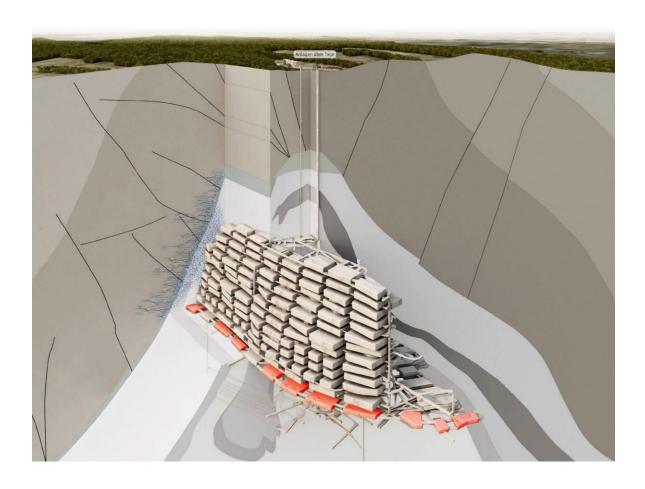

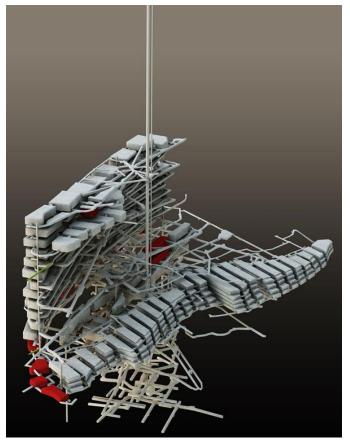



Der Eintritt eines

# Auslegungsüberschreitenden Lösungszutrittes (AüL)

ist für die Asse

als Notfall definiert.



#### **DIE 2 ZIELE DER NOTFALLPLANUNG**



Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Notfalls



Minimierung der Konsequenzen durch

- Minimierung der austretenden Lösungsmenge
- Minimierung der Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus den Einlagerungskammern
- Verzögerung der Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus dem Bergwerk



#### DIE 4 WICHTIGSTEN VORSORGEMAßNAHMEN



Das Bergwerk **stabilisieren** und Hohlräume reduzieren



Strömungsbarrieren /
Abdichtbauwerke bauen



Lösungsmanagement verbessern




Notfallmaßnahmen planen und vorbereiten



#### DIE 4 WICHTIGSTEN NOTFALLMAßNAHMEN



Einlagerungskammern und Infrastrukturräume verfüllen



**Gegenflutungslösung** einbringen



Aus dem Bergwerk zurückziehen



Schächte Asse 2 und Asse 4 verfüllen und abdichten





#### STATUS DER STABILISIERUNGSARBEITEN

#### Die Stabilisierungsmaßnahmen reduzieren die Bewegungen des Bergwerks


rund 413.000 Kubikmeter Sorelbeton wurden eingebracht

rund 235.000 Kubikmeter müssen noch verfüllt werden

Die sogenannte Firstspaltverfüllung wird voraussichtlich 2024 abgeschlossen. (Mit Ausnahme der Abbaureihe 3.)



## DAS BERGWERK IST KAUM WIEDERZUERKENNEN

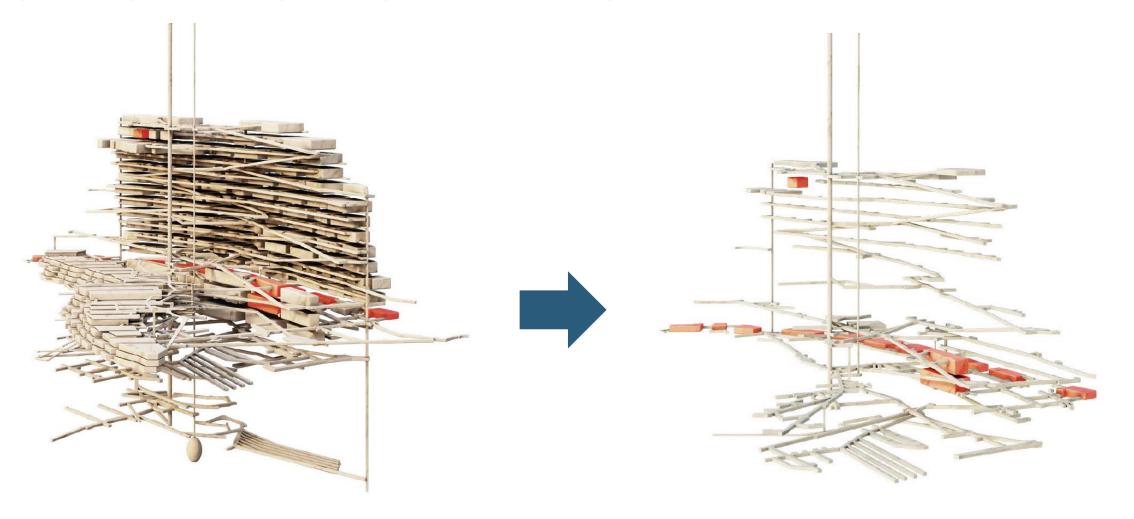



## STATUS DER STRÖMUNGSBARRIEREN

Die Strömungsbarrieren verzögern den Kontakt der Lösung mit dem Atommüll

**44 Strömungsbarrieren** sind errichtet

ca. 40 Strömungsbarrieren sind noch ausstehend

Zeitgleich finden in der Schachtanlage Asse II umfangreiche Injektionsarbeiten statt.



#### **OPTIMIERUNG DES LÖSUNGSMANAGEMENTS**

#### Zukünftig wird die BGE mit größeren Lösungsmengen sicher umgehen können



Die Anlage zum Fassen von Lösungen II (AFL II) ist betriebsbereit, aber noch nicht in Betrieb



Die Anlage zum Fassen von Lösungen auf der 490-Meter-Ebene wird derzeit fertiggestellt und soll 2023 in den Probetrieb gehen



Die Kavernenstrecken auf der 825-Meter-Ebene werden bis Ende 2022 fertiggestellt



Die Hauptfassungsstelle auf der 658-Meter-Ebene ist funktionstüchtig



#### STATUS DER NOTFALLMAßNAHMEN

Die Notfallmaßnahmen werden vorbereit und erst bei Eintritt eines Notfalls umgesetzt



Errichtung der Notfallbaustoffanlage zur Produktion von Sorelbeton über Tage



Einlagerungskammern mittels Bohrungen erkunden und erschließen



Sicherstellung der Verfügbarkeit der Gegenflutungslösung






#### HINTERGRÜNDE

#### Strömungsbarrieren wurden bereits vor der Notfallplanung errichtet

Von 1909 bis 1964 werden rund 5 Millionen Kubikmeter\*
Salz abgebaut

Seit 1988 treten in der Südflanke des Bergwerkes Salzlösungen aus dem Deckgebirge in das Bergwerk



Von 1967 bis 1978 werden rund 126.000 Fässer mit Atommüll eingelagert

Seit 2003 werden in der Asse **Strömungsbarrieren** errichtet

<sup>\*</sup> In einer ursprünglichen Version wurde hier 5,8 Millionen Kubikmeter genannt. Das ist nicht korrekt und wurde korrigiert.




## DIE 5 AUFGABEN DER STRÖMUNGSBARRIEREN

- 1 Behinderung der Lösungsdurchströmung der Einlagerungsbereiche
- 2 Einlagerungsbereiche als quasigeschlossenes System kapseln
- Lösungsbewegungen lenken und begrenzen
- 4 Einlagerungsbereiche stabilisieren
- 5 Kalibereiche vor Umlöseprozessen schützen



## SEIT 100 JAHREN BEWÄHRT: MAGNESIABINDER

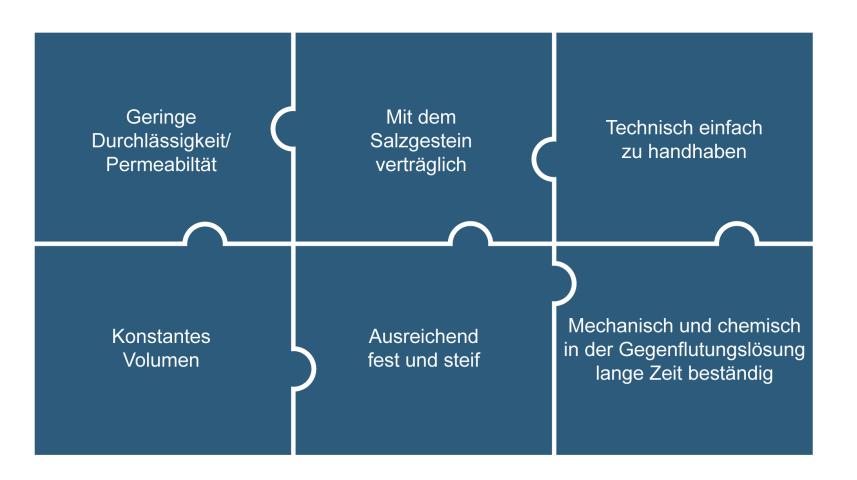






## DAS GRUNDKONZEPT IST EINFACH

Abschluss: Betonage der Kernbarriere (durchgehend)

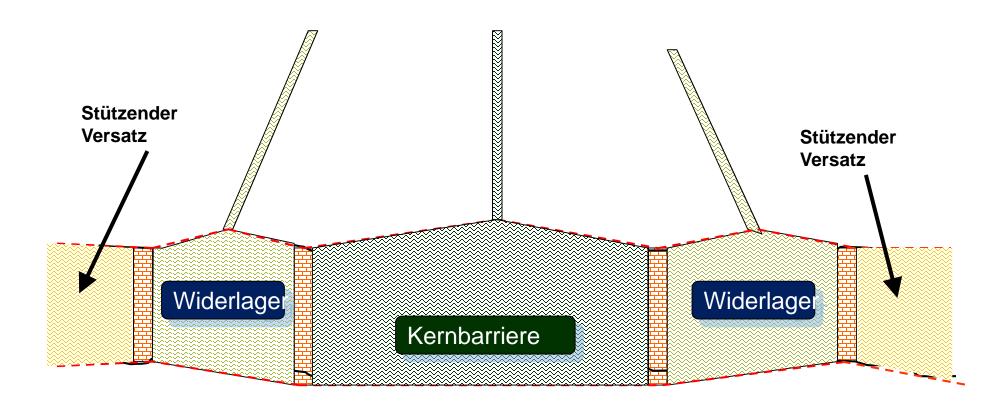

20. Oktober 2022














#### **Hydraulische Anforderungen definieren**

- Das Grubengebäude wird modelliert
- Modellrechnungen zur Nuklidausbreitung werden durchgeführt
- Der hydraulische Mindestwiderstand wird festgelegt

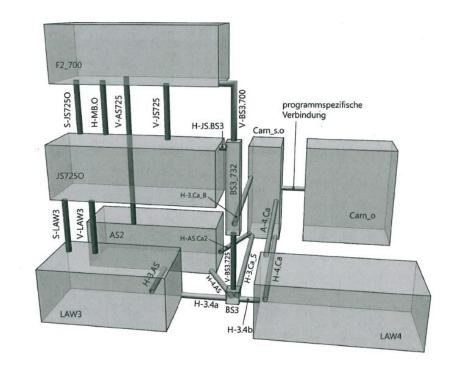

20. Oktober 2022 21 BETRIFFT ASSE





#### Baugrunduntersuchungen






















#### **Geotechnische Standortbeschreibung**

Vorgaben für die technische Planung

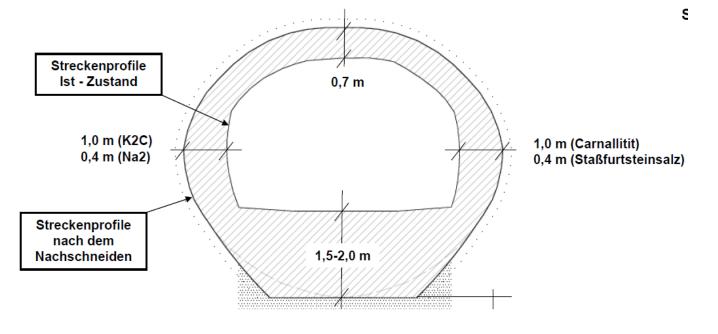





#### **Bautechnischer Nachweis**

- Nachweis, dass die in den Modellierungen getroffenen Annahmen und Anforderungen erreicht werden
- Technische Ziele liegen meist eine Größenordnung über den Mindestanforderungen
- Basis der Qualitätssicherung und der Dokumentationspläne














#### Genehmigung



- atomrechtlichen Genehmigungsunterlagen
- Genehmigungsverfahren
- Bauausführung

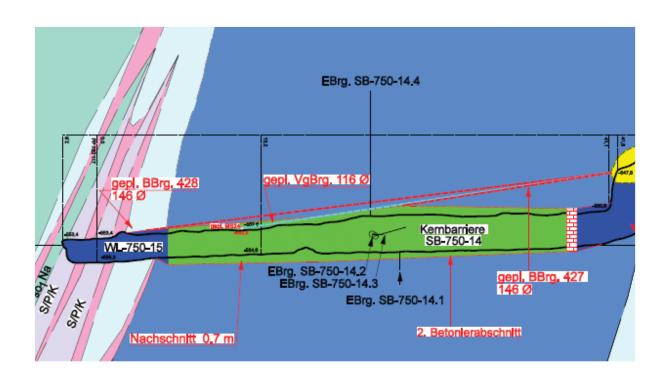









**Standortvorbereitung inklusive Nachschnitt** 











#### **DER BAU ERFOLGT IN 4 SCHRITTEN**



#### Abnahme der vorbereitenden Arbeiten

- Arbeiten werden fortgeführt
- Nacharbeiten werden vorgenommen









Herstellen der Strömungsbarriere




















#### **Abnahme**



Bei Bedarf wird durch Injektionen ertüchtigt

20. Oktober 2022 29 BETRIFFT ASSE





## **QUALITÄTSSICHERUNG**

#### Über und unter Tage wird eine umfangreiche Qualitätssicherung wahrgenommen



Proben **Anlieferung** 



Baubegleitende Rückstellproben



Erstellte **Betonproben** 





## BUNDESGESELLSCHAFT FÜR ENDLAGERUNG

Abteilung Notfallplanung Asse

Schachtanlage Asse II Am Walde 2 38319 Remlingen

www.bge.de www.einblicke.de











